



Svältorna Fiber

Presentation Årsmöte 2017-11-28

Sedan förra årsmötet

Vid förra årsmötet konstaterades att följande punkter kvarstår innan fibernätet är klart.

- ✓ Godkännande från Trafikverket för tryckningar under vägar
- ✓ Projektera färdig nätet.
3. Färdigställa allt schaktarbete med nedplöjning av fiberslangar etc.
- ✓ Upphandla av fiberentreprenör **HC Telecom AB, Trollhättan**
5. Blåsa och svetsa fiber fram till resp. fastighet
6. Slutbesiktiga och dokumentera fibernätet
7. Upphandla en kommunikationsleverantör som kan leverera tjänster i nätet
8. Upphandla en gruppanslutning **Görs när KO är upphandlad**
9. Upphandla en drift- och underhållsentreprenör
10. Börja använda vårt nya fibernät!

Upphandlas strax efter årsskiftet

Tider framåt

Schaktentreprenaden färdigställd	December 2017
Upphandling Kommunikationsoperatör	Januari 2018
Fiberentreprenad start	Januari 2018
Upphandling Drift- och Underhåll	Våren 2018
Upphandling Gruppanslutning	Våren 2018
Fiberentreprenad färdigställd	Prel. April 2018
Installation av aktiv utrustning (KO) klar	Prel. Maj/Juni 2018
Provning och igångsättning	Prel. Juni/Juli 2018
Driftstart	Prel. halvårsskiftet 2018

Upphandling fiberentreprenad

I juli 2017:

Anbud nr 1 4.531.890 kr

I november 2017:

Anbud nr 2 2.990.000 kr

Anbud nr 3 3.936.000 kr

Anbud nr 4 2.675.000 kr (Kan inte leverera färdig entreprenad innan 2018-12-31)

Enligt kalkyl H-EI 2.066.650 kr

Ekonomi

Avstämning mot den kalkyl som upprättats av Herrljunga Elektriska samt den budget som lämnats i samband med stödansökan.

Typ av utgift	Kalkyl Herrlj. EL 2015	Budget idag 2017-11-28
Förprojektering	42.000 kr	0 kr
Schaktentreprenad	4.050.000 kr	6.127.548 kr
Material till schakt (slang etc)	910.000 kr	1.135.317 kr
Uppförande av nodhus	240.000 kr	0 kr
Fiberentreprenad inkl. material	2.066.650 kr	3.289.000 kr
Dämpningsmätning	0 kr	26.000 kr
Projekt- och byggledning	300.000 kr	500.000 kr
Ekonomiadministration	55.000 kr	55.000 kr
Upphandlingsstöd	10.000 kr	18.000 kr
Besiktning	40.000 kr	40.000 kr
Inmätning av ledningsnätet	36.000 kr	166.250 kr
Förvaltningsplan	15.000 kr	15.000 kr
Ledningsrätt	120.000 kr	120.000 kr
Summa	7.884.650 kr	11.424.665 kr

Ekonomi

Avstämning mot den kalkyl som upprättats av Herrljunga Elektriska samt den budget som lämnats i samband med stödansökan.

Sammanfattning


Budget	+11.424.665 kr	
Hittills beviljat stöd	-3.153.860 kr	
Ytterligare sökt stöd	-1.136.006 kr	
Vår investering	7.034.799 kr	
Anslutningsavgift	4.000 kr	exkl moms

Prelimnär insats

Vid 270 insatser	22.903 kr	exkl ansl.avgift
Hittills fakturerade insatser	20.500 kr	

Påminnelse om grävning på egen tomt

Grävning på egen tomt behöver vara färdigställd innan vintern kommer.

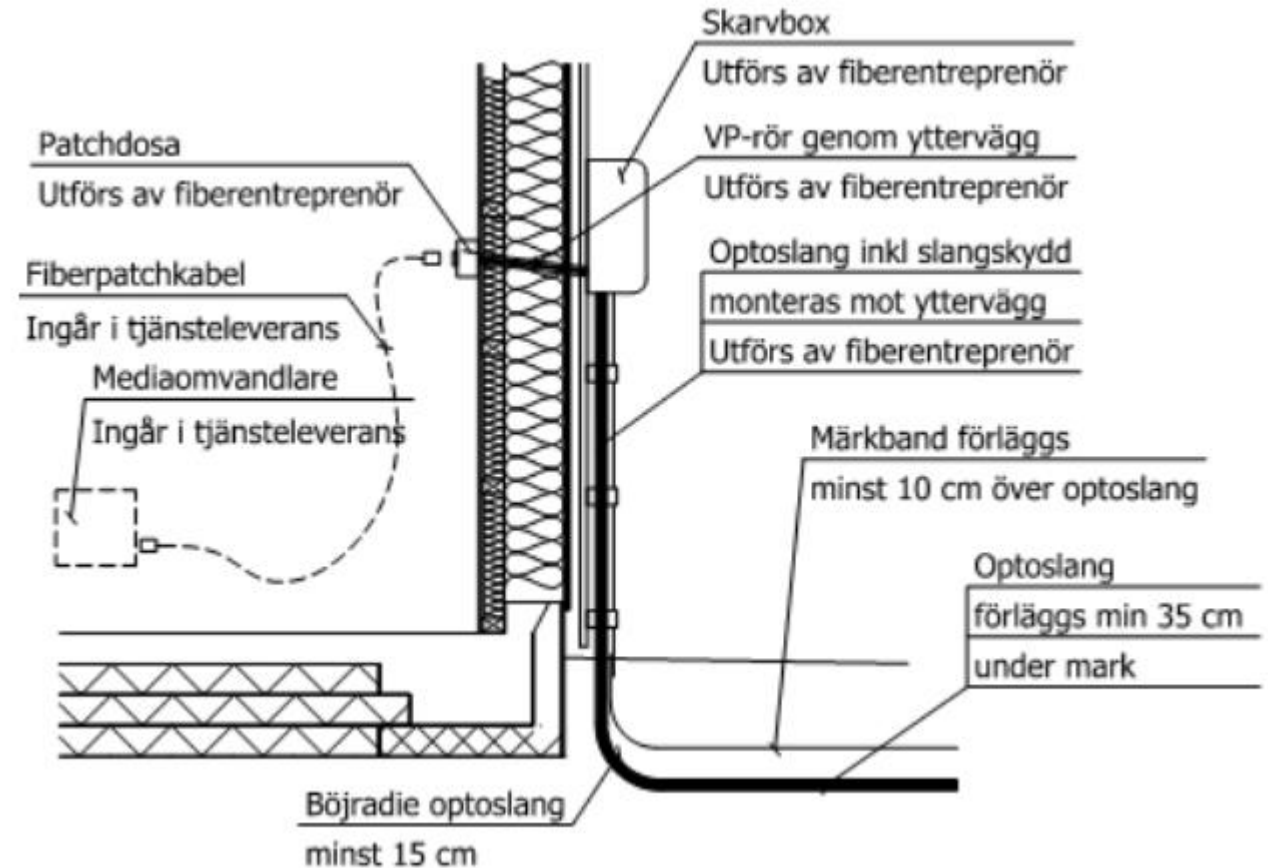

Tack för visat intresse!

